

1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ



Муниципальное образование городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 34**

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА

**«Оптимизация процесса проведения скринингового
обследования в ДОО с целью своевременного выявления
потенциальных нарушений в развитии ребенка-дошкольника»**



ПРИКАЗ О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ



Муниципальное образование городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 34
354008, г. Сочи, ул. Клубничная, 30, телефон, факс (862)255-87-50
primaryschool34@edu.sochi.ru

ПРИКАЗ

01 сентября 2023 г.

№ 166/2

О создании рабочей группы по внедрению принципов бережливого производства (проект «Оптимизация процесса проведения скринингового обследования в ДОО с целью выявления потенциальных нарушений в развитии ребенка-дошкольника»)

В целях улучшения организационных механизмов при предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в ДОО, а также повышения эффективности деятельности муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад комбинированного вида № 34 города Сочи

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по внедрению принципов бережливого производства (проект «Улучшение организационных механизмов при предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в ДОО»).
2. Утвердить распределение функциональных обязанностей в рамках реализации проекта:

Ответственный:

Прус Елена Владимировна, заместитель заведующего по ВМР

Участники рабочей группы:

Габова Юлия Михайловна, старший воспитатель,
Кузнецова Наталья Владимировна, учитель-логопед
Ткаченко Мария Сергеевна, педагог-психолог
Мустафина Ляйсан Ильдаровна, учитель-дефектолог
Зиганшина Ксения Рамильевна, воспитатель


3. Сроки реализации проекта с 04.09.2023 г. – 18.03.2024 г.

4. Рабочей группе:

- разработать план мероприятий по внедрению проектов
- проводить заседания не реже 1 раза в две недели с целью мониторинга качества реализации проекта.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий



О.О. Кузнецова

Участники рабочей группы



Руководитель проекта:

Прус Елена Владимировна, заместитель заведующего по



Команда проекта:

Габова Юлия Михайловна, старший воспитатель,
Кузнецова Наталья Владимировна, учитель-логопед,
Мустафина Ляйсан Ильдаровна, учитель-дефектолог,
Саркисян Фрида Артуровна, педагог-психолог



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса проведения скринингового обследования в ДОО с целью своевременного выявления потенциальных нарушений в развитии ребенка-дошкольника»

Паспорт проекта
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида № 34
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
(наименование организации)

Оптимизация процесса проведения скринингового обследования в ДОО
с целью выявления потенциальных нарушений в развитии ребенка-дошкольника
(название проекта)

УТВЕРЖДАЮ

Кузнецова О.О., заведующий
ФИО, должность руководителя заказчика проекта



О.О. Кузнецова

Общие данные:			Обоснование
<p>Заказчик: Кузнецова Ольга Олесяевна, заведующий Процесс: диагностика детей Границы процесса: от статуса «Согласие родителей на проведение диагностики ребенка» до статуса «Разработка индивидуального образовательного маршрута ребенка» Руководитель проекта: Прус Елена Владимировна, заместитель заведующего по ВМР Команда проекта: Габова Юлия Михайловна, старший воспитатель, Кузнецова Наталья Владимировна, учитель-логопед, Мустафина Ляйсан Ильдаровна, учитель-дефектолог, Саркисян Фрида Артуровна, педагог-психолог.</p>			<ol style="list-style-type: none"> Несвоевременное выявление проблем в развитии ребенка приводит к длительному процессу коррекционной работы, повышенным временным затратам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, психолога Недостаточный уровень компетенций родителей приводит к запущенности логопедических и психолого-педагогических проблем в развитии ребенка, несвоевременности обращения за помощью, что в дальнейшем затрудняет коррекционную работу с ребенком, в некоторых случаях делает ее неэффективной Длительный процесс при обращении родителей в ГППК МДОБУ
Цели и эффекты			Сроки
Наименование цели	Текущие показатели	Целевой показатель	<ol style="list-style-type: none"> Старт проекта 04.09.2023 г.; Анализ текущей ситуации и исправление ошибок с 5.09.2023 г.- 25.09.2023 г. - картирование процесса с 5.09.2023 г.- 15.09.2023 г.; Разработка плана действий с 25.09.2023 г.- 9.10.2023 г. Реализация плана действий с 9.10.2023 г.- 15.01.2024 г. Закрепление результатов. Разработка стандартов. Закрепление проекта с 16.01.2024 г. – 16.02.2024 г. Мониторинг результатов с 19.02.2024 г. – 18.03.2024 г.
1. Сокращение времени специалистов на коррекционную работу с детьми при сохранении качественного уровня такой работы 2. Превентивное выявление проблем логопедического и психолого-педагогического	2 месяца 100% детей	10 дней 100% детей	

4

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



Проблема	
1	Ребенок не посещает ДОО
2	Социально-психологическая неготовность родителей (отказ)
3	Родители не пришли на заседание ППк

5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

ПОСТРОЕНИЕ ПИРАМИДЫ ПРОБЛЕМ



1. Временные потери специалиста на проведение скринингового обследования детей
2. У специалиста нет времени на консультацию
3. Временные потери специалистов на взятие согласия с родителей на проведение скринингового обследования и уведомления их о заседании ППк




Проблема	Причина	Решение
Временные потери специалистов на взятие согласия с родителей на проведение скринингового обследования и уведомления их о заседании ППк	Бланки вручаются родителям только при встрече, в бумажном варианте	Размещение бланка «согласия» на сайте ДОО Уведомления через мессенджеры
Временные потери специалистов на обследование	Педагогически «запущенные дети» по вине родителей Много сложных детей, требующих особого внимания	Проведение превентивной просветительской работы с родителями (установочные встречи, родительские собрания, вебинары) Перераспределение персонала
У специалиста нет времени на консультацию родителей	Высокая загруженность специалиста	Предварительная запись Приглашение специалистов ЦПДК

7

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

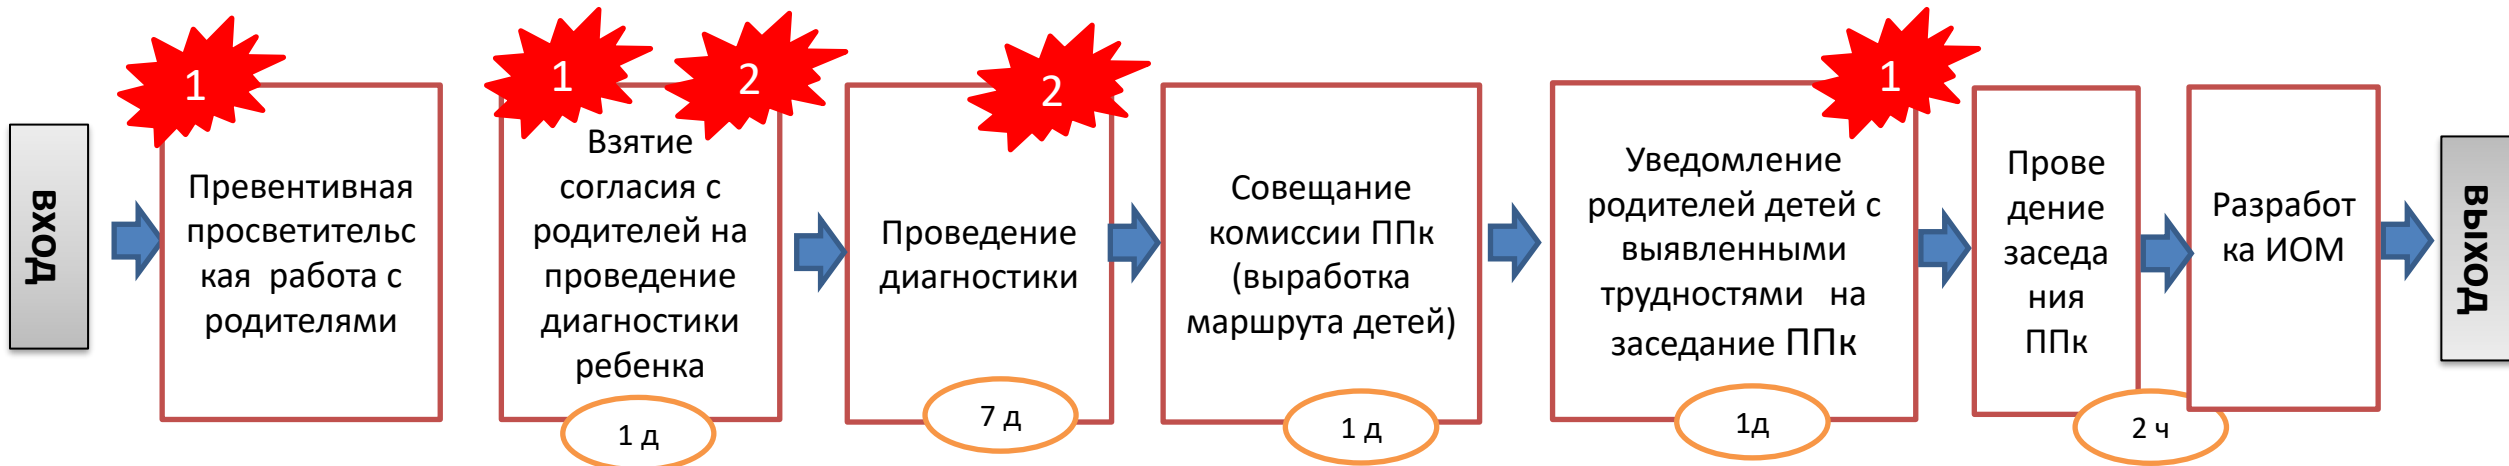


	Проблема
1	Социально-психологическая неготовность родителей (отказ)
2	Ребенок не посещает ДОО

8

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА





ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Проблемы	Причины	Решение	Ответственный	Срок
Длительный процесс на выявление трудностей в развитии ребенка	Трудозатратный процесс	Создание творческой рабочей группы	Прус Е.В. зам. заведующего	до 01.02.2024г.
Временные потери специалистов на взятие согласия с родителей на проведение скринингового обследования и уведомления их о заседании ППк	Бланки вручаются родителям только при встрече, в бумажном варианте	Размещение бланка «согласия» на сайте ДОО Уведомления через мессенджеры	Прус Е.В. зам заведующего	до 22.02.2024г
Временные потери специалистов на обследование	Педагогически «запущенные дети» по вине родителей Много сложных детей, требующих особого, большего внимания	Проведение превентивной просветительской работы с родителями (установочные встречи, родительские собрания, вебинары) Перераспределение персонала	Габова Ю.М. старший воспитатель, Кузнецова Наталья Владимировна, учитель-логопед, Мустафина Ляйсан Ильдаровна, учитель-дефектолог, Ткаченко Мария Сергеевна, педагог-психолог.	постоянно
У специалиста нет времени на консультацию	Высокая загруженность	Предварительная запись Приглашение специалистов ЦПДК	Прус Е.В. зам.зав. заведующего, Габова Ю.М. старший воспитатель	в течение всего периода



ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

БЫЛО



СТАЛО



**РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТА****«Улучшение организационных механизмов при предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в ДОО»**

h	Ед. из.	Цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Эффективность, %
1	День	Сокращение времени протекания процесса	2 месяца	10 дней	100%



Контактные данные:

Руководитель проекта:

ФИО Прус Е.В.

Тел: 89183062059

E-mail: aliena.prus@mail.ru

Ответственный за заполнение презентации:

ФИО Габова Ю.М.

Тел: 89618640300

E-mail: gabova84@list.ru
